

平成29年9月発行

諏訪町ポンプ場 工事だより

こんにちは。地域の皆様には日頃よりご理解、ご協力をたまり心より感謝しております。
現在、本体工事の前段の作業として場内に埋設されている管の切り廻し工事を行っています。
また、天候で遅れていました長町第2雨水幹線の調査測量は無事終わりました。
来月も埋設管の切り廻し工事とその他本体工事の準備を行います。

そしてご報告ですが、9月22日より現場代理人が「村山」に変わりました。
理由として前任の石田の持病の悪化により現場に常駐できなくなったためです。改めて、皆様にご挨拶を致しますのでよろしくお願い致します。

また、工事につきましてご意見やご質問がございましたらご一報ください。ご意見箱も設置していますのでよろしくお願いいたします。

橋本店・河北建設・長谷川建設JV 諏訪町ポンプ場事務所 村山
TEL 022-226-8212



現場代理人 村山

既設管切替
立坑及び管きょ工
8月21日～作業開始

工事進捗率 6%




平成29年9月25日

発行：橋本店・河北建設・長谷川建設
共同企業体

ポンプ場が出来るまで、
皆様の生活のため、一生懸命つくります！

・既設管切廻しを行う流れを①～④の順番に行う予定です。
現在、場内に埋設されている管に現場周辺の雨水流れていましたが、これから行う地中連続壁工の作業でぶつかってしまうため、ぶつからない位置に管を設置してそちらに雨水を切り廻す作業です。
イラストはあくまで参考ですので現場の施工状況はホームページなどご覧ください。

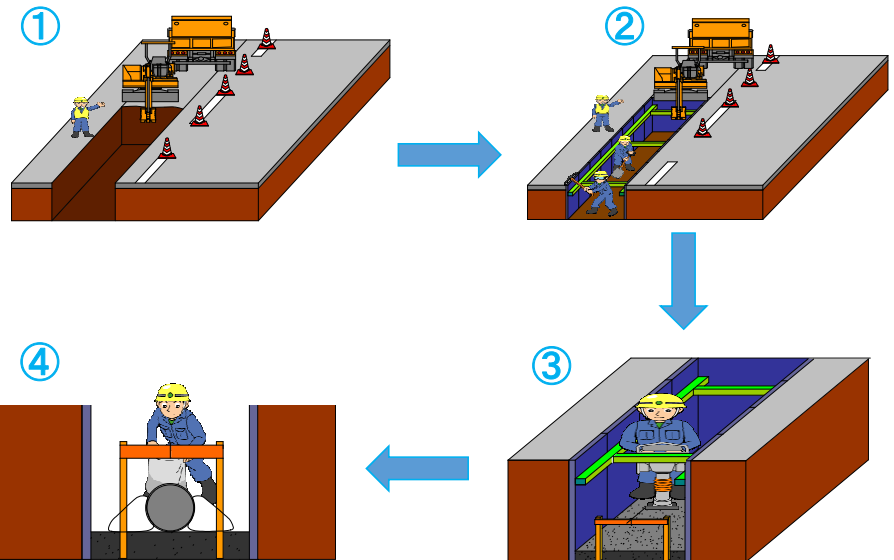

◎当工事現場のホームページを開設しております。
<http://hashimototen.ninja-web.net/suwa/>
ご覧になってみて下さい。



←QRコード

